



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Circolare N.27 RGS del 21/06/22 e Linee Guida Monitoraggio PNRR – seconda parte

***Incontro con i Soggetti attuatori degli interventi PNRR di
competenza MIMS***

Roma, 5 luglio 2022

CRONOPROGRAMMI PROCEDURALI: OBIETTIVI E ATTORI COINVOLTI

Elenco iniziative

Gestione delle iniziative in ambito cronoprogramma


ID Iniziativa: Denominazione: Tipo intervento: Missione: Componente:

46 Iniziative totali

✓ Nel Tempi ⚠ In Scadenza

Denominazione ed ID	Step procedurale	Tipologia Fase	Nome Fase	Data Inizio	Data Fine	Monitor Avvio	Monitor Esecuzione	Stato
① Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale M2C213.3	Altro	Milestone UE	Esperimento procedure di affiliazione	Previsita: 1/7/2021 Aggiornata: 1/7/2021	Previsita: 31/12/2023 Aggiornata: 31/12/2023	⚠ In ritardo		In Definizione
① Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario M2C213.4	Altro	Ultimone Step	Ripartizione risorse ai Comuni	Previsita: 1/12/2021 Aggiornata: 1/12/2021	Previsita: 31/12/2021 Aggiornata: 31/12/2021	⚠ In ritardo	⚠ In ritardo	Completato
① Ciclovie rurali M2C214.1.1	Altro	Ultimone Step	Decreto MMS - MEF di assegnazione dei finanziamenti a seguito dell'acquisizione dei CUP degli interventi	Previsita: 1/12/2021 Aggiornata: 1/12/2021	Previsita: 30/9/2022 Aggiornata: 30/9/2022	✓ Nel tempo		Avviata
① Ciclovie Urbane M2C214.1.2	Altro	Ultimone Step	Predisposizione e approvazione del 50% del PPT	Previsita: 1/1/2022 Aggiornata: 1/1/2022	Previsita: 30/6/2022 Aggiornata: 30/6/2022	⚠ In ritardo		Avviata
① Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitane) M2C214.2	Altro	Target UE	Costruzione di almeno 200 km di piste ciclabili urbane e metropolitane	Previsita: 1/12/2023 Aggiornata: 1/12/2023	Previsita: 31/12/2023 Aggiornata: 31/12/2023	✓ Nel tempo		In Definizione
① Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto a combustibili puliti M2C214.4.1	Altro	Target UE	Costruzione di almeno 360 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane	Previsita: 1/1/2024 Aggiornata: 1/1/2024	Previsita: 30/6/2026 Aggiornata: 30/6/2026	✓ Nel tempo		In Definizione
① Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto alimentati con combustibili puliti e servizio universale M2C214.4.2	Altro	Target UE	Costruzione di almeno 360 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane	Previsita: 1/1/2024 Aggiornata: 1/1/2024	Previsita: 30/6/2026 Aggiornata: 30/6/2026	✓ Nel tempo		In Definizione

- Si riferiscono alle **Misure/Sub-misure** indicate nel **Decreto MEF 6 Agosto 2021**
- **Indicano i passi da compiere per conseguire M&T dell'iniziativa** segnalandone i tempi e lo 'stato' di ciascuno
- Hanno **natura di sintesi** (molti CUP/attuatori)
- **Mirano al monitoraggio del corretto avanzamento dell'attuazione e all'individuazione tempestiva di eventuali scostamenti**
- Sono **strumento fondamentale di comunicazione** con il SC PNRR



UdM si incarica dell'aggiornamento del CP sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti attuatori di 1° livello, condivise e verificate con la DG competente

COME SONO STATI COSTRUITI I CRONOPROGRAMMI PROCEDURALI

Milestone Target e Monitoring Step di Misura/Sub-Misura


1

Passi obbligatori, come gli atti normativi e amministrativi impliciti nella natura del progetto (decreto, bandi, aggiudicazioni, convenzioni/ atti d'obbligo, etc.).

2

Punti di controllo degli aspetti realizzativi: avanzamento lavori (SIL/SAL), obiettivi intermedi e finali, tenendo presente la richiesta del MEF di avere almeno 2 punti di controllo all'anno (incluse M&T)

3

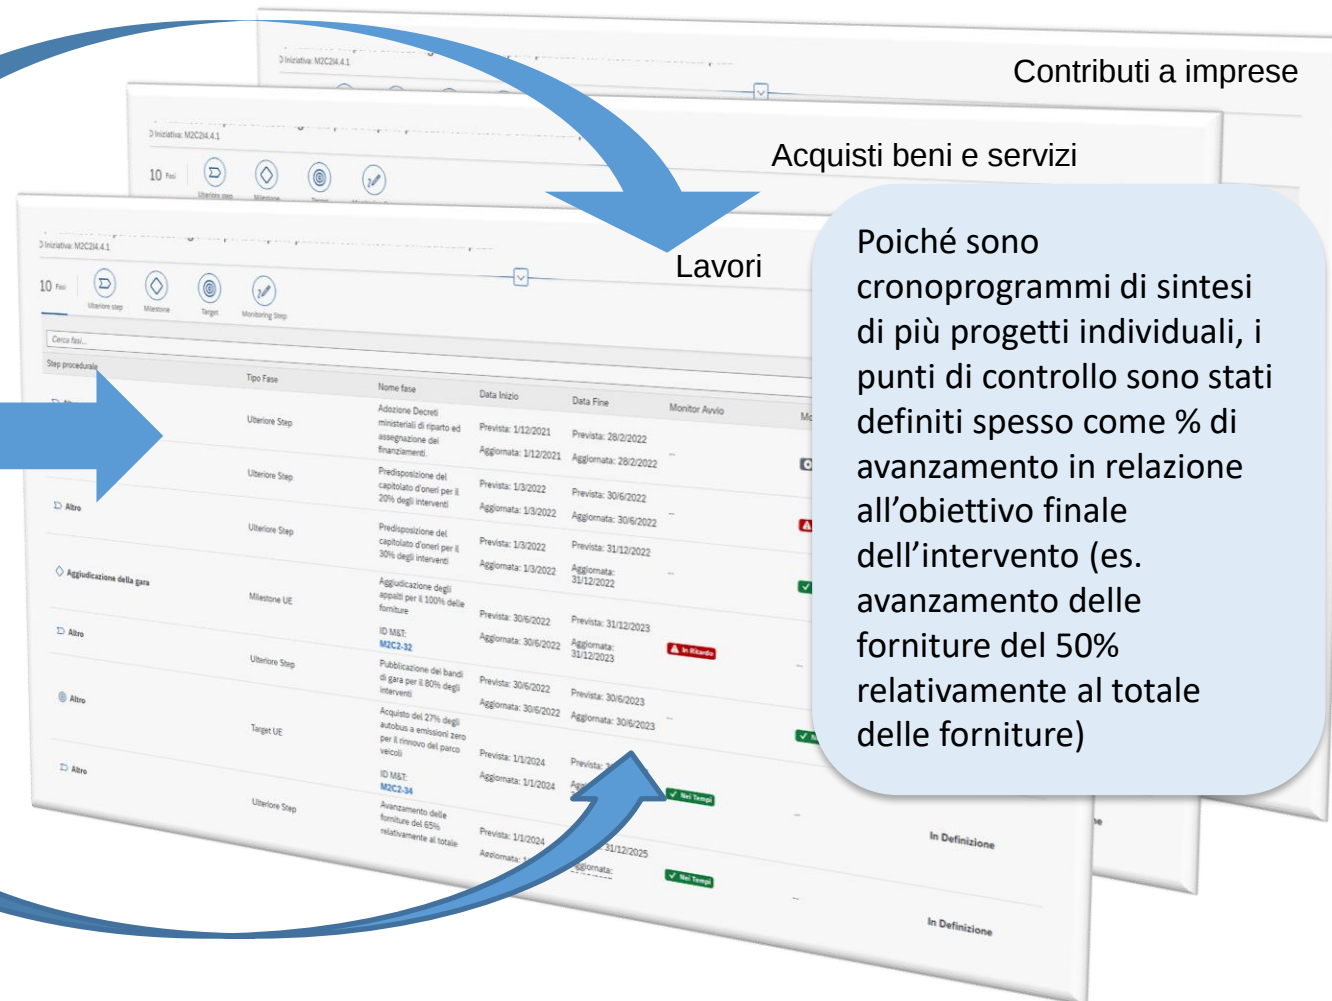

CRONOPROGRAMMI DI PROGETTO ASSOCIATI AI CUP...

Il modulo ReGiS denominato *Configurazione e Gestione delle Operazioni, Anagrafica Progetto - Gestione* è adibito alla funzionalità di caricamento diretto dei dati sui progetti

Nella sezione **Cronoprogramma/Costi/Indicatori** vanno caricati:

- **l'iter procedurale di progetto** (il cronoprogramma procedurale) con le date previste ed effettive per l'avvio e la conclusione degli step predefiniti sulla base della tipologia di operazione
- **il Piano dei Costi** (il cronoprogramma finanziario) indicante gli importi previsti ed effettivi per le varie annualità del progetto
- **il Quadro Economico**
- **indicatori definiti per indicare il contributo al target**
- **gli indicatori comuni UE** della misura a cui il progetto è associato

L'Ufficio II – Monitoraggio della UdM è a disposizione per fornire ai Soggetti Attuatori gli schemi-tipo dei Cronoprogrammi Procedurali di Progetto

The screenshot displays a web application interface. On the left, a table lists project data with columns: Codice Progetto, Titolo Progetto, Codice procedura, and Codice. On the right, there is a search bar with a magnifying glass icon and a '+', and a 'Cerca' button. Below the search bar is another table with columns: Descrizione Misura, Soggetto Attuatore, Amministrazione, and Importo F.

Codice Progetto	Titolo Progetto	Codice procedura	Codice
3000055160	CUP Comune di Venezia	2000054722	M2C2I4.1.1
3000055226	CUP Comune di Ancona	2000054681	M2C2I4.1.2
3000055227	CUP Comune di Bari	2000054682	M2C2I4.1.2
3000055228	CUP Comune di Bergamo	2000054683	M2C2I4.1.2
3000055229	CUP Comune di Bologna	2000054684	M2C2I4.1.2
3000055230	CUP Comune di Brescia	2000054685	M2C2I4.1.2
3000055231	CUP Comune di Cagliari	2000054686	M2C2I4.1.2
3000055232	CUP Comune di Catanzaro	2000054689	M2C2I4.1.2
3000055232	CUP Comune di Ferrara	2000054691	M2C2I4.1.2
3000055233	CUP Comune di Firenze	2000054692	M2C2I4.1.2

Descrizione Misura	Soggetto Attuatore	Amministrazione	Importo F
Ciclovie Urbane	50001196	Min.delle Infrastrutture e d...	1.649.131
Ciclovie Urbane	50002207	Min.delle Infrastrutture e d...	1.572.476
Ciclovie Urbane	50000957	Min.delle Infrastrutture e d...	4.836.871
Ciclovie Urbane	50005616	Min.delle Infrastrutture e d...	1.424.961
Ciclovie Urbane	50007053	Min.delle Infrastrutture e d...	3.491.996
Ciclovie Urbane	50000925	Min.delle Infrastrutture e d...	1.806.931
Ciclovie Urbane	50000049	Min.delle Infrastrutture e d...	3.498.541
Ciclovie Urbane	50000833	Min.delle Infrastrutture e d...	3.209.211
Ciclovie Urbane	50004618	Min.delle Infrastrutture e d...	2.412.796

... E DOVE SARANNO VISUALIZZATI PER IL MONITORAGGIO

regis **Pagina iniziale** ▾

Utilità **Attivazione e Configurazione delle Procedure** **Validazione Dati** **Configurazioni**

Assistenza
Assistenza

Documenti Utente
68

Attivazione e Configurazione delle Procedure

Procedura - Creazione
Creare

Procedura - Monitoraggio
Ricerca

Progetto - Creazione
Creare

Progetto - Monitoraggio
Ricerca

1

Progetti: 3000055228, CUP Comune di Bergamo

Progetti Lista posizioni Appunti Allegati Storico transazioni Azioni pianificate Stato

▼ Progetti

Dati generali

Codice procedura / Descrizione: 2000054722 CUP Comune di Bergamo

Categoria procedura: Conv

Codice Amministrazione Responsabile: I100 Min.delle Infrastrutture e dei Trasporti

Codice misura: M2C214.1.2

Stato: In elaborazione

CUP: H11B22001930006 CLP: H11B22001930006

COR: 00000000000000000000

ID progetto: 00000000001000055222022

Titolo Progetto: CUP Comune di Bergamo

ID/Soggetto attuatore: 50005616 / COMUNE DI BERGAMO / 80034840167

Autore ultima modifica: ASSIST.PNRR / 28.06.2022

Riferimento esterno:

Totale

Importo autorizzato: 1.424.967,00 EUR

3

Ricerca: Progetti

Codice misura ▾ È ▾ M2C214.1.2

Numero massimo dei risultati: 100

Salvare ric. come: ☐ Rilevare view

Lista ris.: 80 Conc. trovati

Codice Progetto	Titolo Progetto	Codice procedura	Codice misura	Descrizione Misura	Soggetto Attuatore
3000055160	CUP Comune di Venezia	2000054722	M2C214.1.2	Ciclovie Urbane	50001196
3000055226	CUP Comune di Ancona	2000054681	M2C214.1.2	Ciclovie Urbane	50002207
3000055227	CUP Comune di Bari	2000054682	M2C214.1.2	Ciclovie Urbane	50000957
3000055228	CUP Comune di Bergamo	2000054683	M2C214.1.2	Ciclovie Urbane	50005616
3000055229	CUP Comune di Bologna	2000054684	M2C214.1.2	Ciclovie Urbane	50007053
3000055230	CUP Comune di Brescia	2000054685	M2C214.1.2	Ciclovie Urbane	50000925
3000055231	CUP Comune di Cagliari	2000054686	M2C214.1.2	Ciclovie Urbane	50000049
3000055232	CUP Comune di Catanzaro	2000054689	M2C214.1.2	Ciclovie Urbane	50000833
3000055233	CUP Comune di Ferrara	2000054691	M2C214.1.2	Ciclovie Urbane	50004618
3000055234	CUP Comune di Firenze	2000054692	M2C214.1.2	Ciclovie Urbane	50001201

2

Progetto

Visualizza <-> Modifica Altro ▾

ID e selezione view

Progetto: 0000000001000055222022 CUP Comune di Bergamo

Dettaglio:

Riepiloghi:

Anagrafica Progetto Dettaglio Aiuti Soggetti Correlati Gestione Fonti Cronoprogramma/costi/indicatori Procedura aggiudicazione

ANAGRAFICA PROGETTO

Stato progetto: NAVV

Amministrazione: I100 Ministero delle Infrastr. e Mobilità Sost.

Codice Misura: M2C214.1.2

Ciclovie Urbane

Codice Pratt: 1000000180

CUP: H11B22001930006

Cod locale progetto: H11B22001930006

Titolo progetto: REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO PER RAFFORZAMENT...

Codice convenzione: 2000054683

4

ALLEGATI



AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI E SEGNALETICA DI AIUTO

- **ReGiS**, sulla base delle date previste di inizio e fine delle diverse fasi di attivazione/esecuzione di una misura/sub-misura **informa gli utilizzatori dell'allineamento temporale dell'avanzamento dei progetti.**
- Il sistema di comunicazione si avvale anche di **rappresentazione grafica di tipo semaforico (verde, giallo, rosso)** che indica se la misura è nei tempi, prossima a qualche scadenza importante o in ritardo.
- **Attenzione: le date di M&T e il loro stato (in Avvio, avviato, concluso, etc.) sono prefissate e non modificabili direttamente dall'utente.** Per modificarle è necessario che Udm MIMS certifichi che siano state raggiunte.

